

**Obnova budovy telocvične Základnej školy
Štúrova 228/109, Spišská Stará Ves**
HARMONOGRAM PRÁC

Realizácia

Obvodový plášť

Búranie existujúceho okapového chodníka
Otlčenie kabríncu v rozsahu 100%
Dočasná demontáž výlezu na strechu
Kontaktný zateplovací systém soklovej časti EPS PERIMETER (100, 140mm)
Montáž lešenia
Demontáž prvkov a doplnkov na fasáde objektu (vetracie mriežky)
Demontáž vonkajších parapetov
Očistenie a otlčenie vonkajších omietok v rozsahu 80%
Zakrývanie výplní vonkajších otvorov
Kontaktný zateplovací systém MW (steny 200, 300 mm + ostenia 40mm)
Vonkajšia silikónová omietka
Demontáž lešenia
Vonkajšia silikónová omietka sokla
Spätná montáž výlezu na strechu a montáž vetracích mriežok
Montáž striešky nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu
Základy pod tepelné čerpadlá
Okapový chodník D4/D5, vrátane pieskového lôžka a zhutneného podkladu
Oplotenie tepelných čerpadiel

Strešný plášť

Demontáž strešných zvodov, žľabov, hákov, kolien a príslušenstva
Dočasná demontáž bleskozvodu
Kompletné odstránenie vrstiev strešného plášťa po vrstvu perlitbetónu - Skladba ST1
Kompletné odstránenie vrstiev strešného plášťa po vrstvu prefabrikátov - Skladba ST2
Murovanie nových atík z betónových tvárnic a nadbetonávka
Montáž OSB dosiek a XPS zateplenia na atiky
Realizácia nových vrstiev strešného plášťa - skladba ST1
Realizácia nových vrstiev strešného plášťa - skladba ST2
Montáž odkvapového systému
Spätná montáž bleskozvodu

Výplňové konštrukcie

Demontáž sklobetónových tvárnic a vonkajšieho betónového parapetu
Demontáž existujúcich dverí
Demontáž existujúcich okien, vrátane vnútorných parapetov
Montáž plastových okien (montáž na pásky), vrátane parapetov
Montáž plastových dverí vchodových

Zdravotechnika

Zdravotechnické inštalácie

Vykurovanie a TUV


Montáž a dodávka UK

Elektromontáže

Montáž elektroinštalácie kotolne a MaR
Elektrická prípojka
Vnútorná elektroinštalácia - WC imobilný

Stavebná časť

Demontáž krytov vykurovacích telies
Vybúranie podláh B4
Odstránenie keramickej dlažby s poterom B7
Búranie priečok B17 + vloženie prekladu, montáž zárubne
Murovanie porobetónových priečok D7
Vnútorná omietka + keramický obklad D25
Doplnenie poterov po zrealizovaní rozvodov D8
Keramické dlažby D8, D24
SDK Podhľad D26
Vnútorné maľby stropov a stien
Osadenie dverného kridla D22
Osadenie ochranného siete na okná a montáž krytov vykurovacích telies

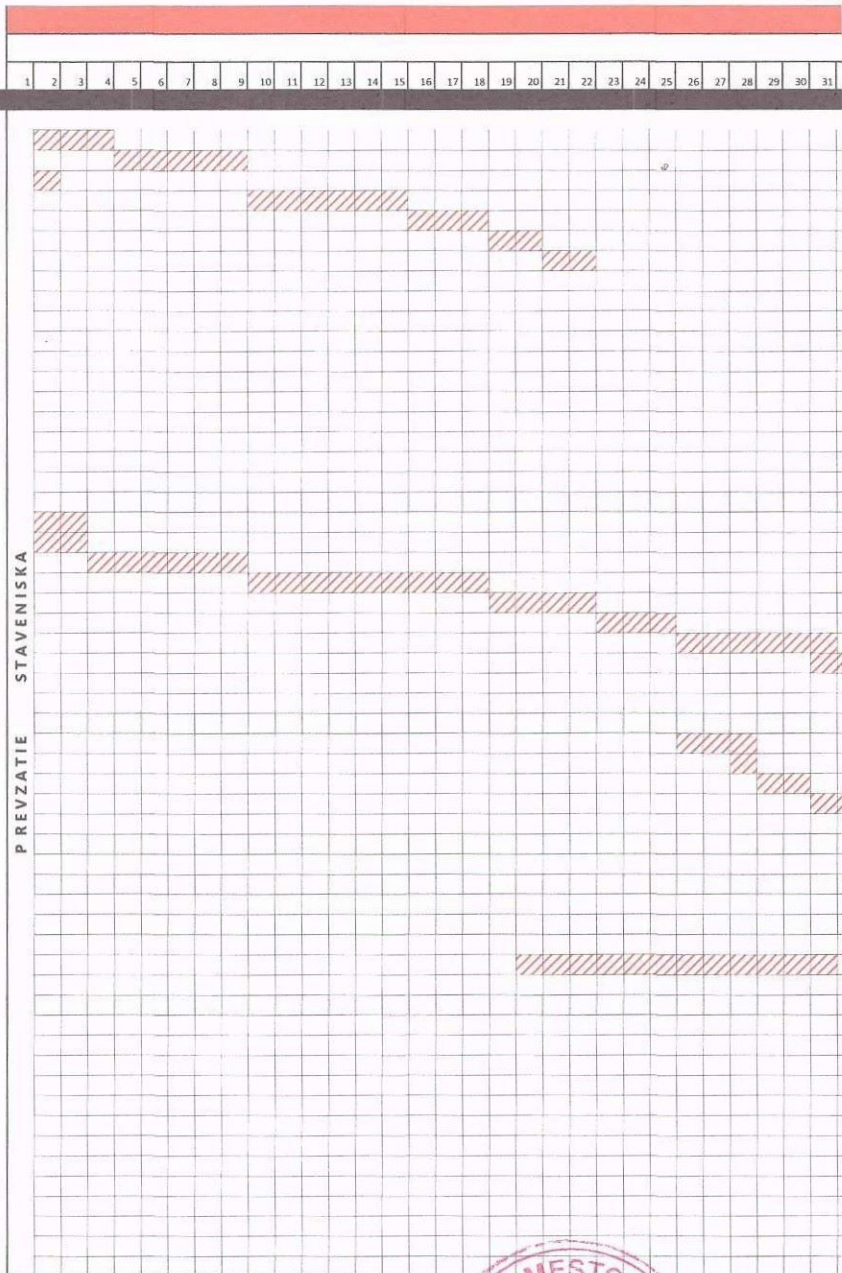

V Spišskej Belej, dňa

13.2.2025

DARUS
STAV s.r.o.

IČO: 50 074 059 | IČ DPH: 212 016 6257

Tatranská 923/20
Spišská Beľá
059 01



[Handwritten signature]

LEHOTA VÝSTAVBY 150 dní

Φ



93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

