DARUS STAV s.r.o.

REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY SPIŠSKÁ STARÁ VES

Spišská Stará Ves č.s. 478, Spišská Stará Ves

HARMONOGRAM PRÁC

LEHOTA VÝSTAVBY 230 dní

	Realizácia
01	**Stavebná časť**
	Zariadenie staveniska (kancelárie, sklady, spevnené plochy, oplotenie, soc. zariadenia)
	Prípravné práce (stavebný výťah, vežový žeriavu, zhozy na odpad, odstavenie objektu od sieti)
	Sondážne práce a statické zabezpečenie objektu pre búraním
	Búranie okapového chodníka
	Búranie zámkovej dlažby, obrubníkov a časti spevnených plôch
	Búranie betónovej konštrukcie prestrešenia, búranie prestrešenia - lexan
	Demontáž vonkajšieho obkladu soklа
	Výkop základových jám - výtah, prestrešenie vstupu
	Základové konštrukcie (debnenie, výstuž, betonáž, HI) - výtah, prestrešenie vstupu
	Montáž lešenia
	Demontáž kominu a požiarneho rebrika
	Demontáž bleskozvodu, falcovanej krytiny a odkvapového systému
	Demontáž strešnej konštrukcie (krov, škvarobetón, atikové a štítové murivo, nosné murivo, ŽB veniec)
	Demontáž betónového prefabrikovaného stropu - priestor pre schodiská
	Vytvorenie otvorov v nosných stenách (nový výťah, vnútrené a vonkajšie otvory)
	Statické zosilenie konštrukcií 1.NP-2.NP
	Výťahová šachta z DT, vrátane vencov a stropnej dosky (vystužovanie, betonáž, debnenie)
	Stĺpy z DT pre zastrešenie vstupu (vystužovanie, betonáž)
	Nadbetonávka + veniec 3. NP (TLdebnenie, výstuž, betonáž,)
	Murovanie nosných stien 4. NP (vrátane osadenia prekladov)
	ŽB veniec a preklady 4. NP (debnenie, výstuž, betonáž)
	Nová strešná konštrukcia (krov, poistná hydroizolácia, latovanie, profilovaná krytina)
	Prestrešenie vstupu (krov + drevená konštrukcia, TI, OSB debnenie, separačná fólia, strešná fólia)
	Demontáž PVC okien vrátane vnútorných a vonkajších parapetov
	Demontáž vstupných dverí vrátane rámov a prahov
	Demontáž sklobetónových tvárnic
	Demontáž vnútorných dverí
	Demontáž nášlapných vrstiev podlah
	Otlčenie vnútorných omietok a odstránenie keramických obkladov
	Búranie vnútorných priečok
	Osadenie nových PVC okien a AL dverí (vrátane osadenia parapetov)
	Kontaktný zateplovací systém stien MW (silikónová omietka/ tehlový obklad, grafika a nápisy)
	Podbitie striech CETRIS doskami a tatranským profilom
	Odkvapový systém
	Murovanie deliach priečok (vrátane osadenie prekladov a zárubní)
	Cementový poter 4. NP (vrátane separačnej fólie a TI)
	Samonivelizačné stierky
	Dodávka a montáž vnútorných schodísk
	Vnútorné omietky stien a stropov
	Tepelná izolácia stropu nad 4.NP (vrátane vrchného záklopu z OSB)
	SDK konštrukcie, podkrovné schody
	Kovové doplnkové konštrukcie (zábradlia a madlá)
	Vnútorné malby stien a stropov, nátery kovových a stolárskych výrobkov, umývateľný náter stien
	Keramické obklady stien
	Keramické dlažby (vrátane nivelačných stierok)
	Povlakové podlahy - koberce, PVC (vrátane prípravy podkladu a penetrácie)
	Dodávky a montáž interiérových dverí
	Dodávka a montáž osobného výťahu
	Vyčistenie objektu
	Demontáž lešenia
	Výkop ryhy okolo objektu
	Zvislá izolácia proti vode a vlhkosti (odkop, penetračný lak, zvislá izolácia NAIP)
	Zateplenie soklovej časti (XPS, marmolit/ nopová fólia)
	Drenážny systém okolo objektu (drenážna rúra, uloženie geotextílie, spatný zásyp kamenivom)
	Okapový chodník (osadenie betónových obrubníkov, zásyp kamenivom/ betónová dlažba)
02	**ZDRAVOTECHNIKA**
	Zemné práce
	Vonkajšie rúrové vedenia
	Vsakovacie bloky a RŠ
	Vnútorná kanalizácia
	Vnútorný vodovod
	Zariaďovacie predmety
03	**VZDUCHOTECHNIKA**
03.1	VZDUCHOTECHNIKA
03.2	VZT_KUCHYŇA
04	**VYKUROVANIE**
	Nerezový komín
	Kotoľňa a strojovňa
	Rozvodné potrubia a armatúry
	Vykurovacie telesá
05	**HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU**
	Hlasová signalizácia požiaru
06	**ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA**
	Elektrická požiarna signalizácia
07	**PLYNOINŠTALÁCIA**
	Zemné práce
	Montáž potrubia a plynomerná skriňa
08	**ELEKTROINŠTALÁCIA SO01e**
	Elektromontáže - silnoprúd
	Elektromontáže - slaboprúd
09	**BLESKOZVOD SO01b**
	Zemné práce
	Elektromontáže
10	**SO.06 PRELOŽKA NN VEDENIA VSD, a.s.**
	Zemné práce
	Elektromontáže

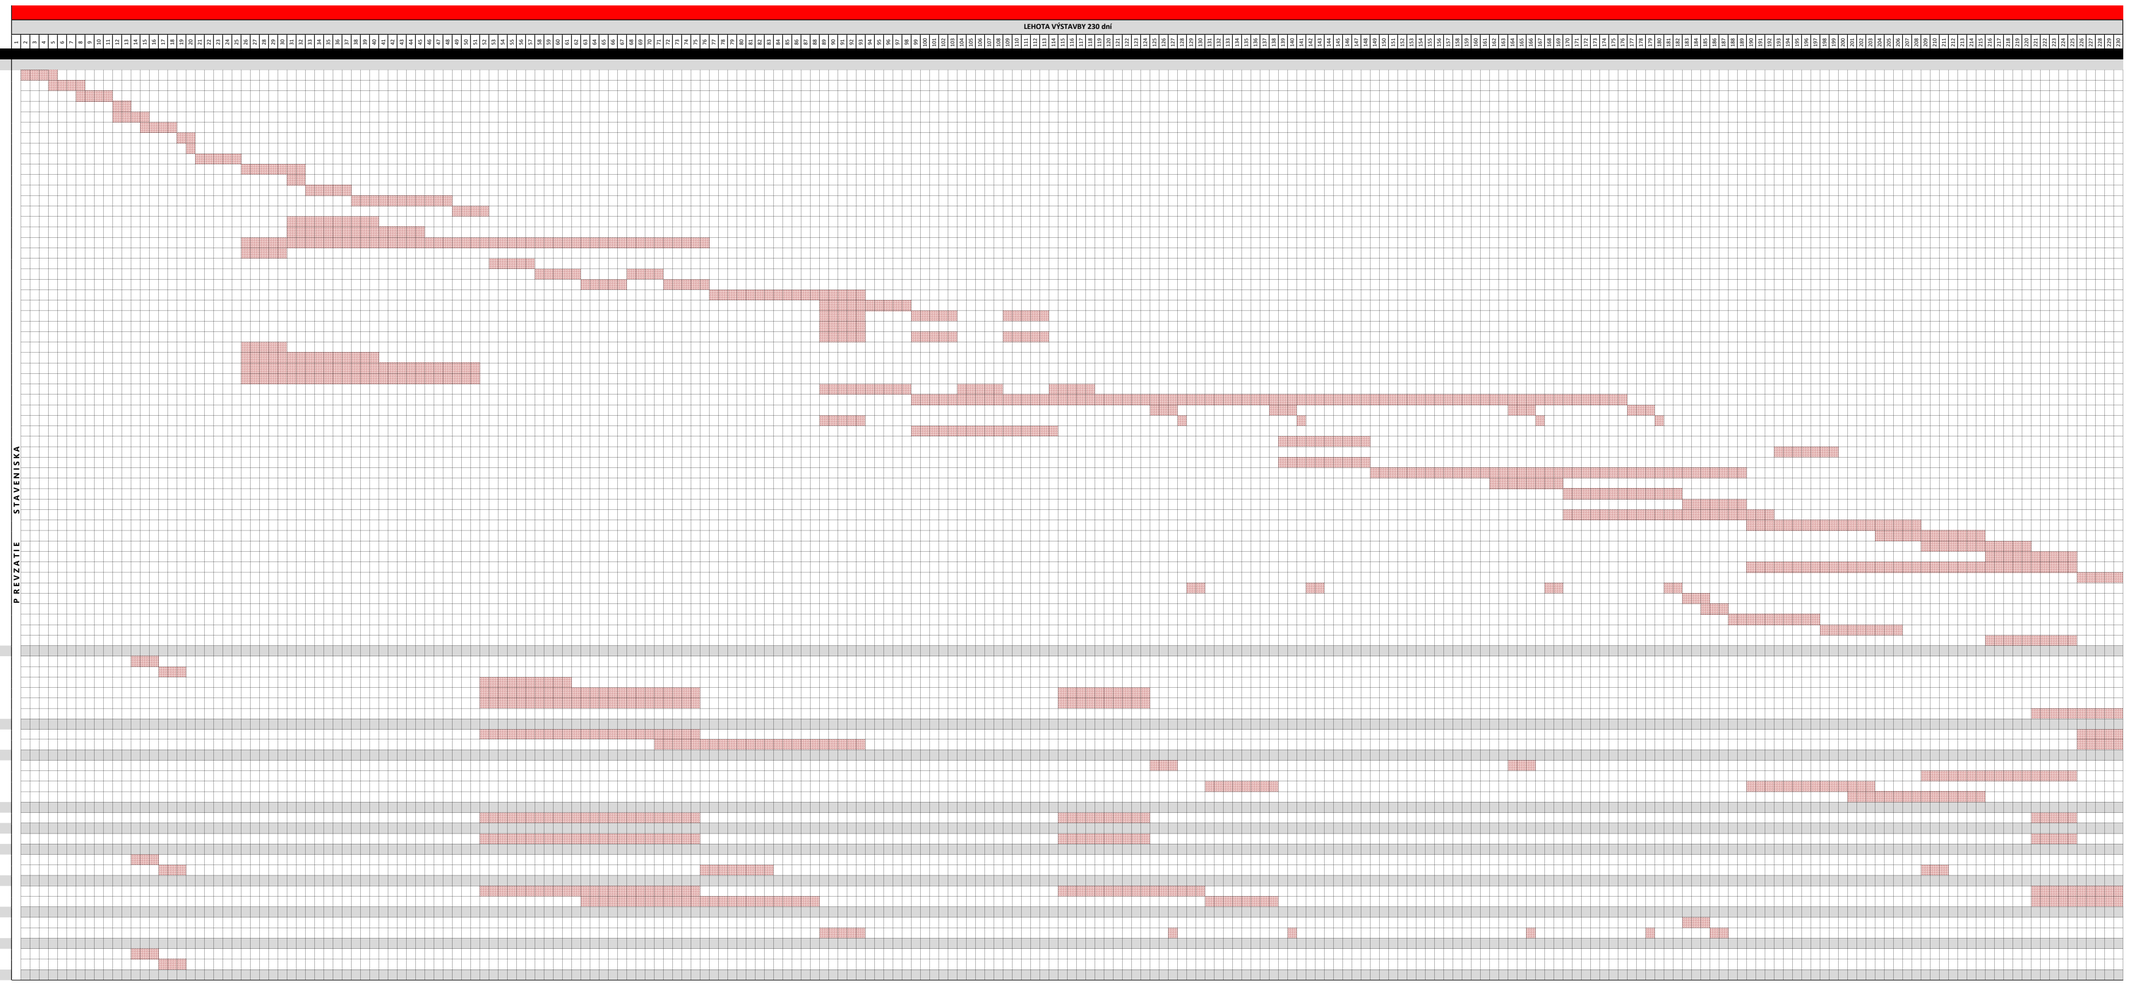

V Spišskej Belej dňa
